

揚水機場工事だより 6月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第8号 配布

梅雨の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

工事進捗につきましては、吐出水槽と余水吐、配水槽が完成し、現在は吸水槽とファームポンドの施工を進めております。7月下旬より土砂置場の建造にも着手する予定です。なお、吸水槽は7月末、ファームポンドと土砂置場は9月上旬に完成する予定です。


また、8月上旬にポンプ建屋の基礎杭打設作業を1週間の工程でおこないます。春先に施工した土木構造物の杭打設とは工法が異なるため、作業中に発生する振動・騒音は前回と比べて小さくなりますが、近隣にお住まいの方々には、引き続きのご協力を改めてお願い申し上げます。

お気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。
株式会社 廣瀬 現場事務所
 住 所：新潟市西蒲区三ツ門301-1
 電話番号：025-201-7310
 担当者：小澤、野村
 現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。
 ぜひご覧ください!!

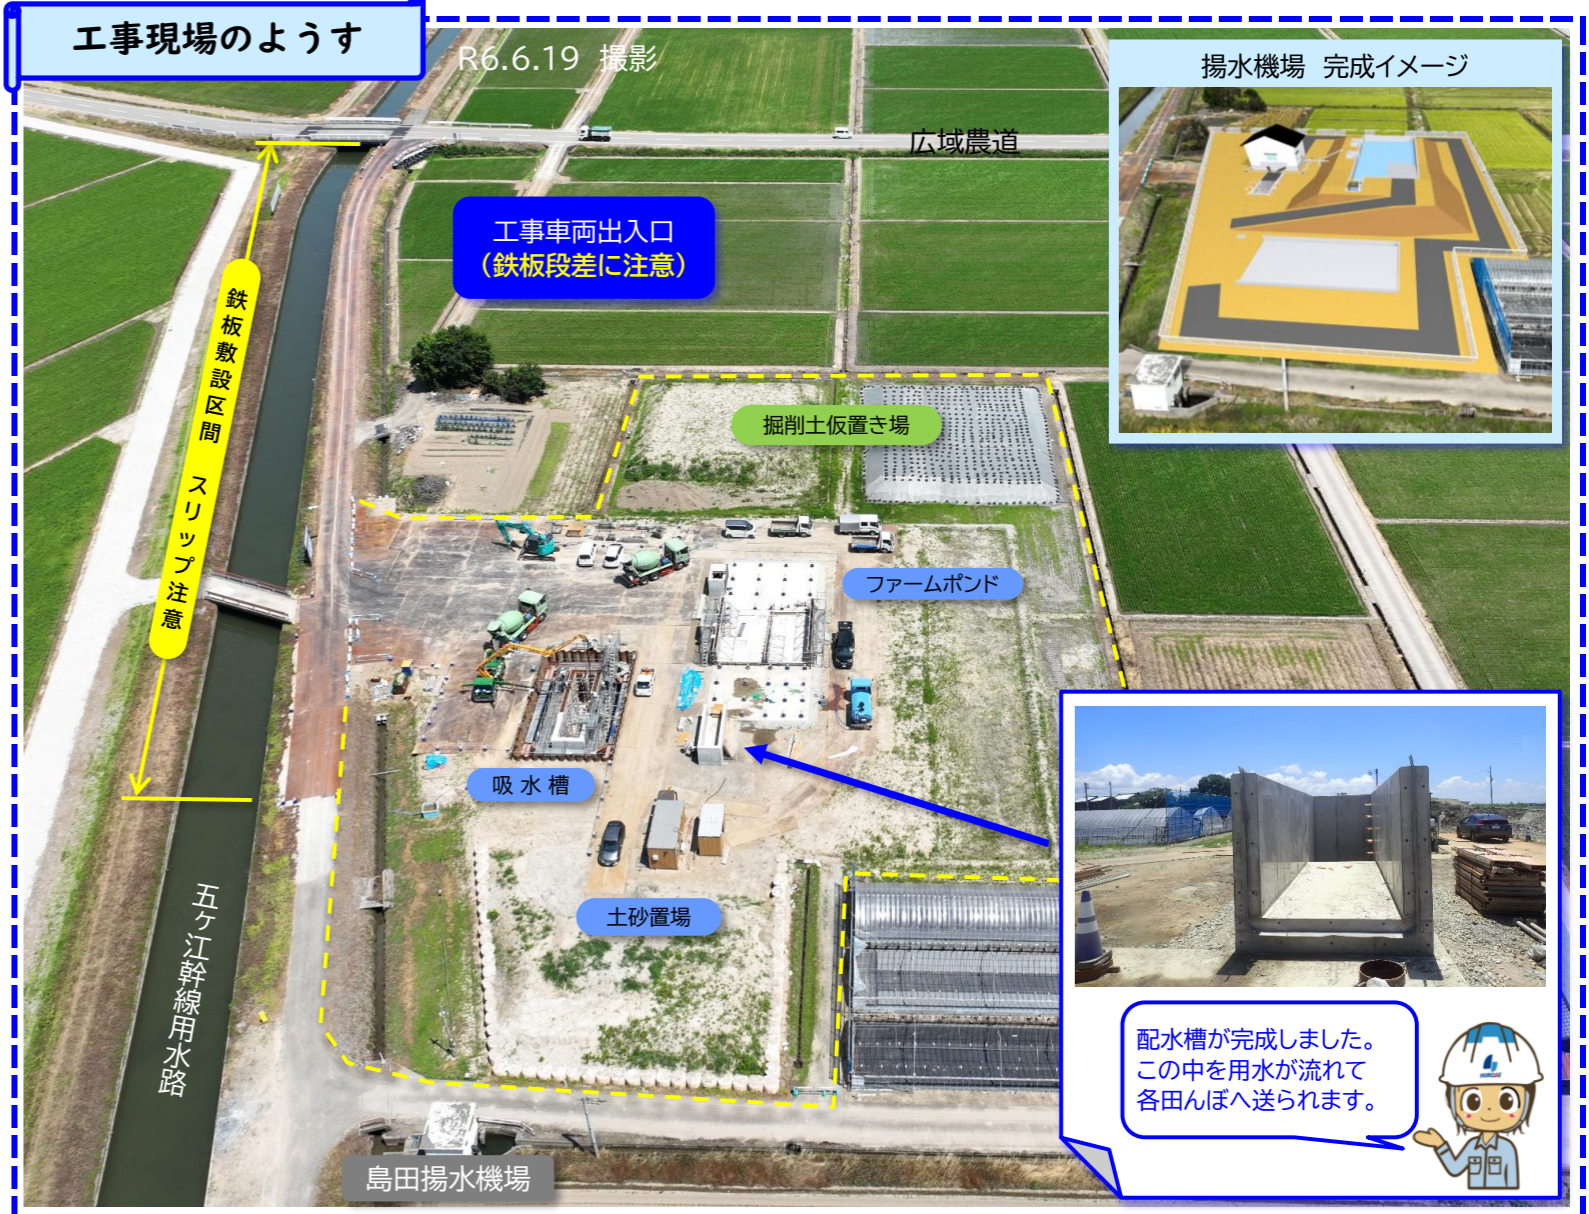

7月の工事予定

令和6年7月の工程表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
作業名	作業の内容	使用する重機	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
作業土工	吸水槽周囲を土砂で埋め戻す	油圧ショベル、ダンプトラック																																
土留め撤去工	吸水槽周囲の立坑を撤去する	ホイールクレーン、鋼矢板圧入機																																
ファームポンド工	ファームポンドを建造する	油圧ショベル、生コンポンプ車																																
土砂置場	土砂置場を建造する	油圧ショベル、生コンポンプ車																																
大型車両の往来	あり																																	
交通規制の予定	なし																																	

・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。
 ・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。
