

揚水機場工事だより 9月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第11号 配布

秋分の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

工事進捗につきましては、今月下旬に隣接する用水路と揚水機場内の吸水槽をつなぐ取水管の配管作業が完了しました。

今後の工程につきましては、10月に敷地内の盛土・整形作業と作業ヤードの撤去・片付け作業をおこない、11月上旬をもって弊社による工事は完了する予定です。引き続きご協力をお願い申し上げます。

なお、一部未施工の施設につきましては、今後発注される別途工事により施工が行われ、令和8年春までに完成する予定です。

お気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。
HIROSE 株式会社 廣瀬 現場事務所

住所：新潟市西蒲区三ツ門301-1

電話番号：025-201-7310

担当者：小澤、野村


現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。
ぜひご覧ください!!



工事現場のようす

R6.9.17 撮影

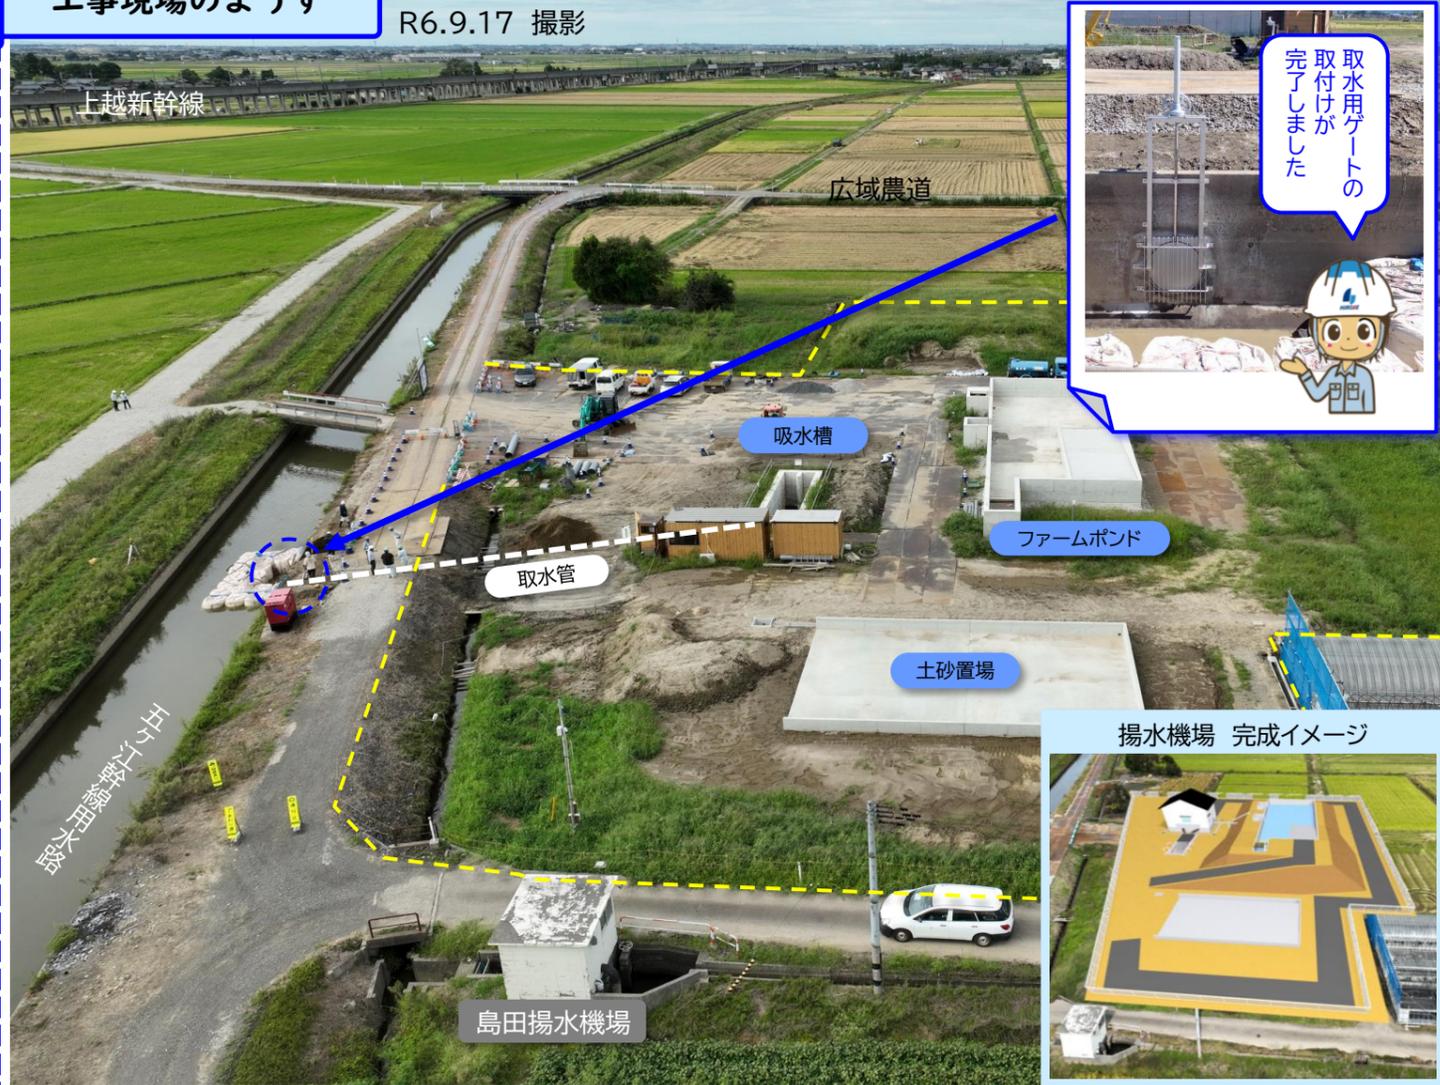

10月の工事予定

令和6年10月の工程表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
作業名	作業の内容	使用する重機	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
盛土整形	ファームポンドの周囲を盛土する	油圧ショベル、ダンプ、振動ロー																																
ヤード整地	敷地内の土地を平らに均す	油圧ショベル																																
作業ヤード撤去	工事で使用した仮設材を搬出する	油圧ショベル、大型トラック																																
工事用道路撤去	工事で使用した仮設道路を撤去する	油圧ショベル、大型トラック																																
後片付け																																		
大型車両の往来	あり																																	
交通規制の予定	なし																																	

・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。

・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。
