

揚水機場工事だより 1月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第3号 配布

大寒の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

工事は、昨年11月中旬に完了したサーチャージ盛土により、下の軟弱な地盤の圧密沈下が落ち着いたので、1月22日から盛土の撤去作業を開始しました。撤去した土砂は、近隣の地権者様のご厚意で、来季休耕していただく田面に仮置きをさせていただいております。



2月末までに盛土撤去と構造物基礎杭の準備作業を完了させ、3月より基礎杭の打込み作業を開始する計画です。

引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。寒さ厳しい折、お風邪などお召しにならぬよう、ご自愛ください。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。 **株式会社 廣瀬 現場事務所**
 住所：新潟市西蒲区三ツ門301-1
 電話番号：025-201-7310
 担当者：小澤、野村
 現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。ぜひご覧ください!!

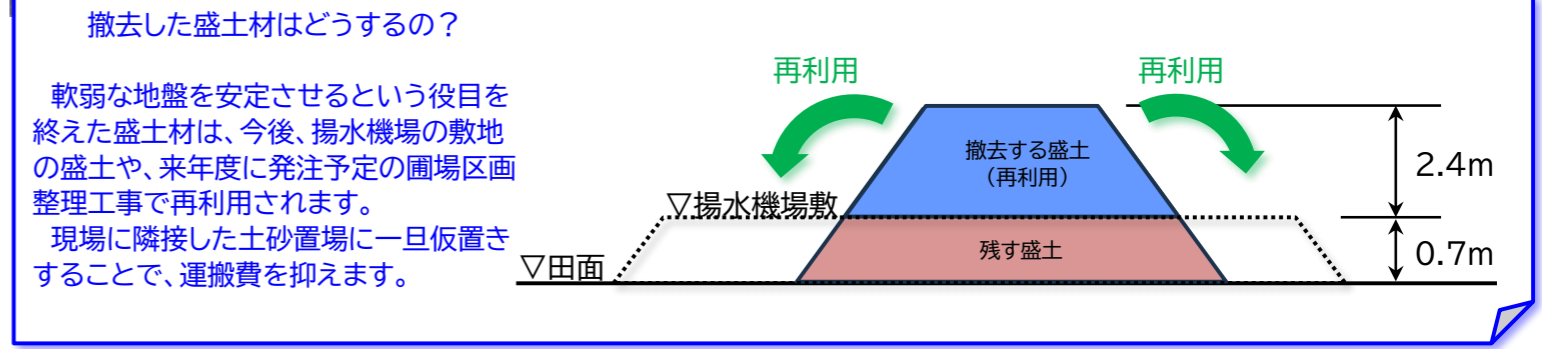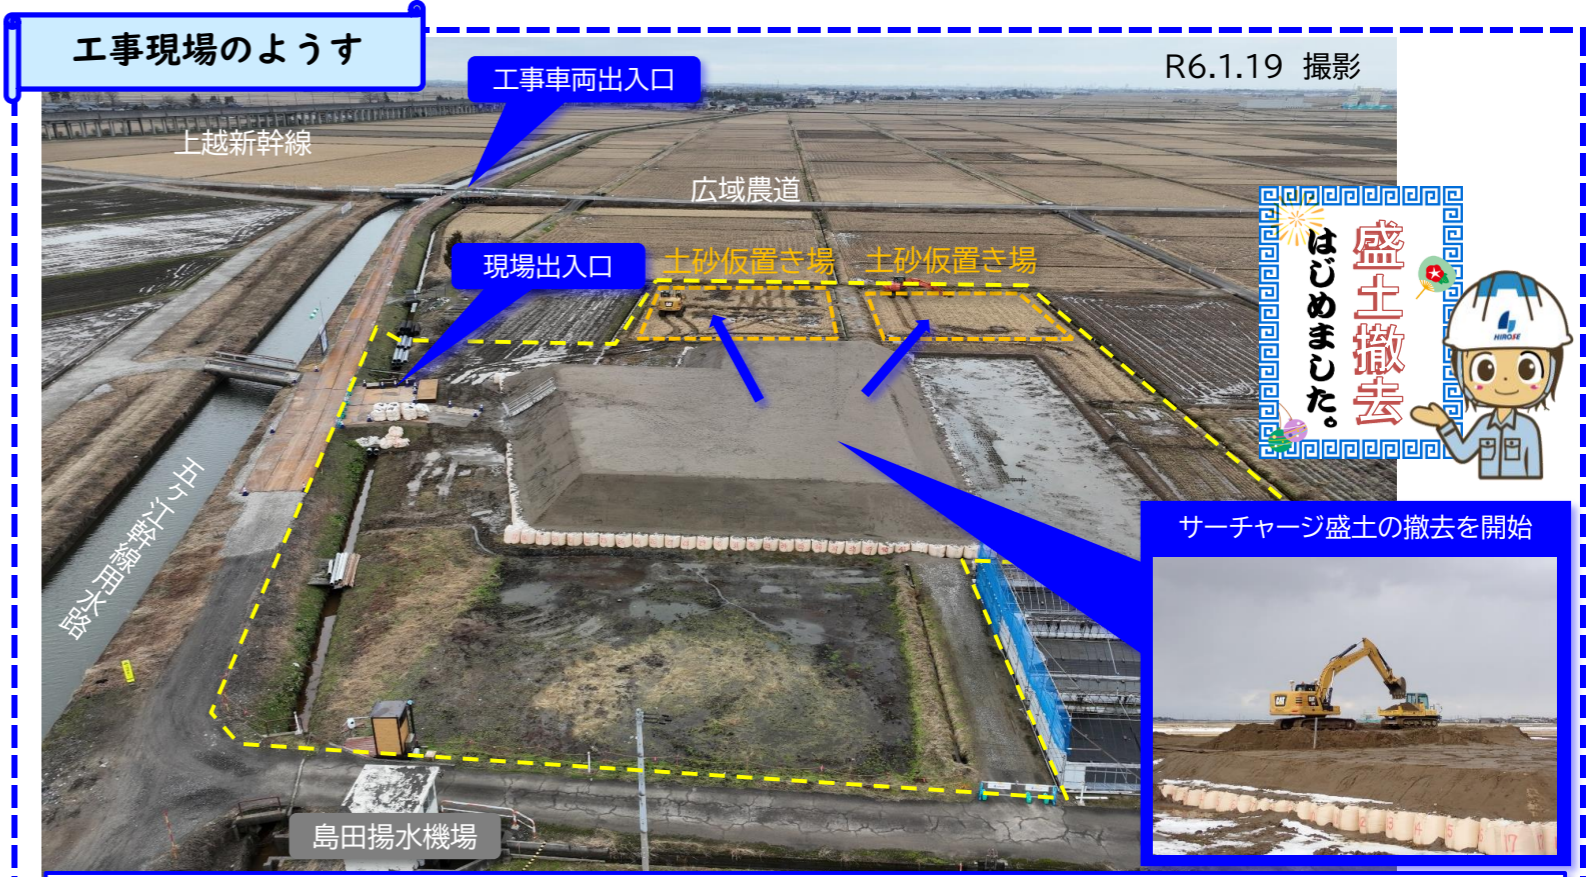

2月の工事予定

令和6年2月の工程表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2
作業名	作業の内容	使用する重機	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
サーチャージ盛土撤去	サーチャージ盛土を掘削して撤去する	油圧ショベル、クローラダンプ	■																														
周辺盛土	揚水機場敷地内を盛土する	ブルドーザ、搭乗式ローラー	■																														
工事用道路拡幅	工事車両出入口、現場出入口を拡幅する	油圧ショベル																															
表層混合処理	杭打機の作業地盤をセメントで改良する	油圧ショベル																															
作業ヤード造成	ヤード内に敷鉄板を設置する	油圧ショベル																															
杭基礎工	構造物の基礎となる鋼管杭を打込む	クローラクレーン、油圧式パイロパンプ																															
大型車両の往来	あり																																
交通規制の予定	なし																																

・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。
 ・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。
